

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER ANLAGEN

Erst-, Wiederholungs- und Änderungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr. **ANL/24/09/2026/003**
 Anlage / Objekt **UV Bühne links (UV-B1)**
 Seite **1 von 2**

Auftraggeber & Prüfung

Auftraggeber / Prüfort Stadttheater Konstanz		Adresse Konzilstraße 11, 78462 Konstanz	
Bereich / Gebäude Hauptbühne	Anlage / Objekt UV Bühne links (UV-B1)	Prüfungs-ID UV-B1-2026	Prüfdatum 24.09.2026
Grund der Prüfung / Prüffart ☐ Neuanlage ☐ Bestand ☐ Änderung ☒ Wiederholung		Prüfnorm ☐ DIN VDE 0100-600 ☒ DIN VDE 0105-100 ☐ beide	
Prüfer/-in Hendrik Rück	Qualifikation ☒ Elektrofachkraft ☐ EuP	Prüfgerät (Installationstester) Fluke 1663	Seriennummer 45120987

Netz, Einspeisung & Erdung

Netzsystem ☒ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TN-C ☐ TT ☐ IT		Netzspannung 230/400 V	Art der Einspeisung Festanschluss	Netzbetreiber Stadtwerke Konstanz	Vorsicherung / Speisepunkt NH 3x63A
Netzmessung am Speisepunkt ☒ Drehstrom ☐ 1-phasig	U _{L1-N} 231,4 V	U _{L2-N} 229,8 V	U _{L3-N} 233,0 V	U _{L1-L2} 400,1 V	U _{L2-L3} 398,7 V
	U _{L1-L3} 401,2 V	U _{N-PE} 0,8 V	Frequenz 50,0 Hz	Drehfeld ☒ rechts ☐ links	
Anschlusskabel Typ NY-Y-J	Leiter 5G	Querschnitt 16 mm²	Länge 25 m	Zus. Potenzialausgleich ☒ Ja ☐ Nein	Durchgängigkeit PA ☒ i.O. ☐ n.i.O.
				R _E 2,1 Ω	Erdungsmesspunkt Potenzialausgleichsschiene (PAS)

Besichtigen & Erproben

i.O. = in Ordnung · n.i.O. = nicht in Ordnung · n.a. = nicht anwendbar

Besichtigen	i.O.	n.i.O.	n.a.	Besichtigen	i.O.	n.i.O.	n.a.	Erproben	i.O.	n.i.O.	n.a.
Betriebsmittel	☒	☐	☐	Zusätzlicher Potenzialausgleich	☐	☐	☒	Funktion Anlage	☒	☐	☐
Kabel & Leitungen	☒	☐	☐	Berührungsschutz	☒	☐	☐	Polarität / Steckdosen	☒	☐	☐
Zugänglichkeit	☒	☐	☐	Typenschild	☒	☐	☐	Schutzeinrichtungen	☒	☐	☐
Schaltgeräte	☐	☒	☐	Leiterverbindungen	☒	☐	☐	RCD-Prüftaste	☒	☐	☐
Kennzeichnung	☒	☐	☐					Drehrichtung Motoren	☐	☐	☒

Stromkreise – Messen

6 Stromkreise

Nr.	Stromkreis	Leitung		PE · Isolation			Überstromschutz · Impedanz					Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)					Ergebnis	
		Typ · mm²	I _m	R _{PE} Ω	U _{ISO} V	R _{ISO} MΩ	LS	Z _S Ω	I _k A	Z _I Ω	I _{k2} A	Typ I _n /I _{Δn}	x I _{Δn}	I _Δ mA	t _A ms	U _F V	Durchgang	i.O.
1	F1 Steckdosen Werkstatt	NYM-J · 1,5	10	0,12	500	250	B 16A	0,62	371,0	0,55	418,2	A 40/30	5×	18	14	1,2	i.O.	i.O.
2	F2 Licht Bühne	H07RN-F · 2,5	13	Mangel: Leitung am Bühnenportal mechanisch beschädigt (Mantel aufgescheuert), Stromkreis abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Leitung tauschen.														n.i.O.
3	F3 Herd	NYM-J · 1,5	16	0,14	500	252	B 10A	0,72	319,4	0,55	418,2	A 40/30	5×	20	16	1,2	i.O.	i.O.
4	F4 Bühnenmaschinerie Unterbühne links	H07RN-F · 2,5	19	0,45	500	253	B 16A	0,77	298,7	0,55	418,2	A 40/30	5×	21	52	1,2	i.O.	i.O.
5	F5 Büro	NYM-J · 1,5	22	Mangel: Kein RCD vorhanden, Nachrüstung erforderlich.														n.i.O.
6	F6 Klima	H07RN-F · 2,5	25	0,17	500	255	B 10A	0,87	264,4	0,55	418,2	ohne RCD	–	–	–	–	i.O.	i.O.

Grenzwerte: R_{PE} ≤ 0,30 Ω · R_{ISO} ≥ 1,0 MΩ (SELV/PELV ≥ 0,5 MΩ) · I_k, I_{k2} ≥ 5 × I_n (B) bzw. 10 × I_n (C) · I_Δ 0,5–1,0 × I_{Δn} · t_A ≤ 300 / 150 / 40 ms bei 1 / 2 / 5 × I_{Δn} · U_F ≤ U_L (50 V AC, erhöht 25 V) · rot hinterlegt = nicht eingehalten

Ergebnis & Unterschriften

Gesamtbewertung ☐ keine Mängel ☐ Mängel behoben ☒ Mängel festgestellt		Sicherer Gebrauch gewährleistet ☒ Ja ☐ Nein	Prüfplakette erteilt ☐ Ja ☒ Nein	Prüfintervall 1 Jahr	Nächster Prüftermin 24.09.2027
Bemerkungen / festgestellte Mängel Schaltgerät Q2 in der UV-B1 zeigt Brandspuren am Anschlussklemmpunkt L2, Klemme nachgezogen, Schaltgerät muss zeitnah getauscht werden. Stromkreis F2 Licht Bühne ohne ausreichende Beschriftung – Beschriftung der Verteilung ergänzen. Abdeckung der Unterverteilung war nicht verschraubt, wurde vor Ort wieder befestigt. Bei der nächsten Wiederholungsprüfung Isolationswiderstand F4 erneut messen (Tendenz fallend). Empfehlung: RCD Typ B für die Bühnenmaschinerie prüfen lassen, da Frequenzumrichter vorhanden.					
Prüfer/-in Konstanz, 24.09.2026 Ort, Datum			Auftraggeber / Betreiber Konstanz, 24.09.2026 Ort, Datum		
Unterschrift Prüfer/-in · Hendrik Rück 			Unterschrift Auftraggeber/Betreiber		

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER ANLAGEN


Erst-, Wiederholungs- und Änderungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr.	ANL/24/09/2026/003
Anlage / Objekt	UV Bühne links (UV-B1)
Seite	2 von 2

Fotodokumentation

2 Fotos

Foto A

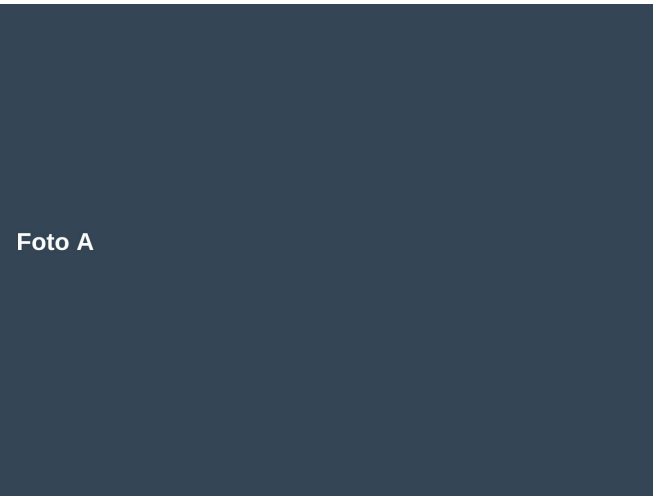

Stromkreis 4 · F4 Bühnenmaschinerie Unterbühne links – Foto 1 von 2

Hoch



Stromkreis 4 · F4 Bühnenmaschinerie Unterbühne links – Foto 2 von 2
